


# Satzung der Gemeinde Büchen über den Bebauungsplan Nr. 43

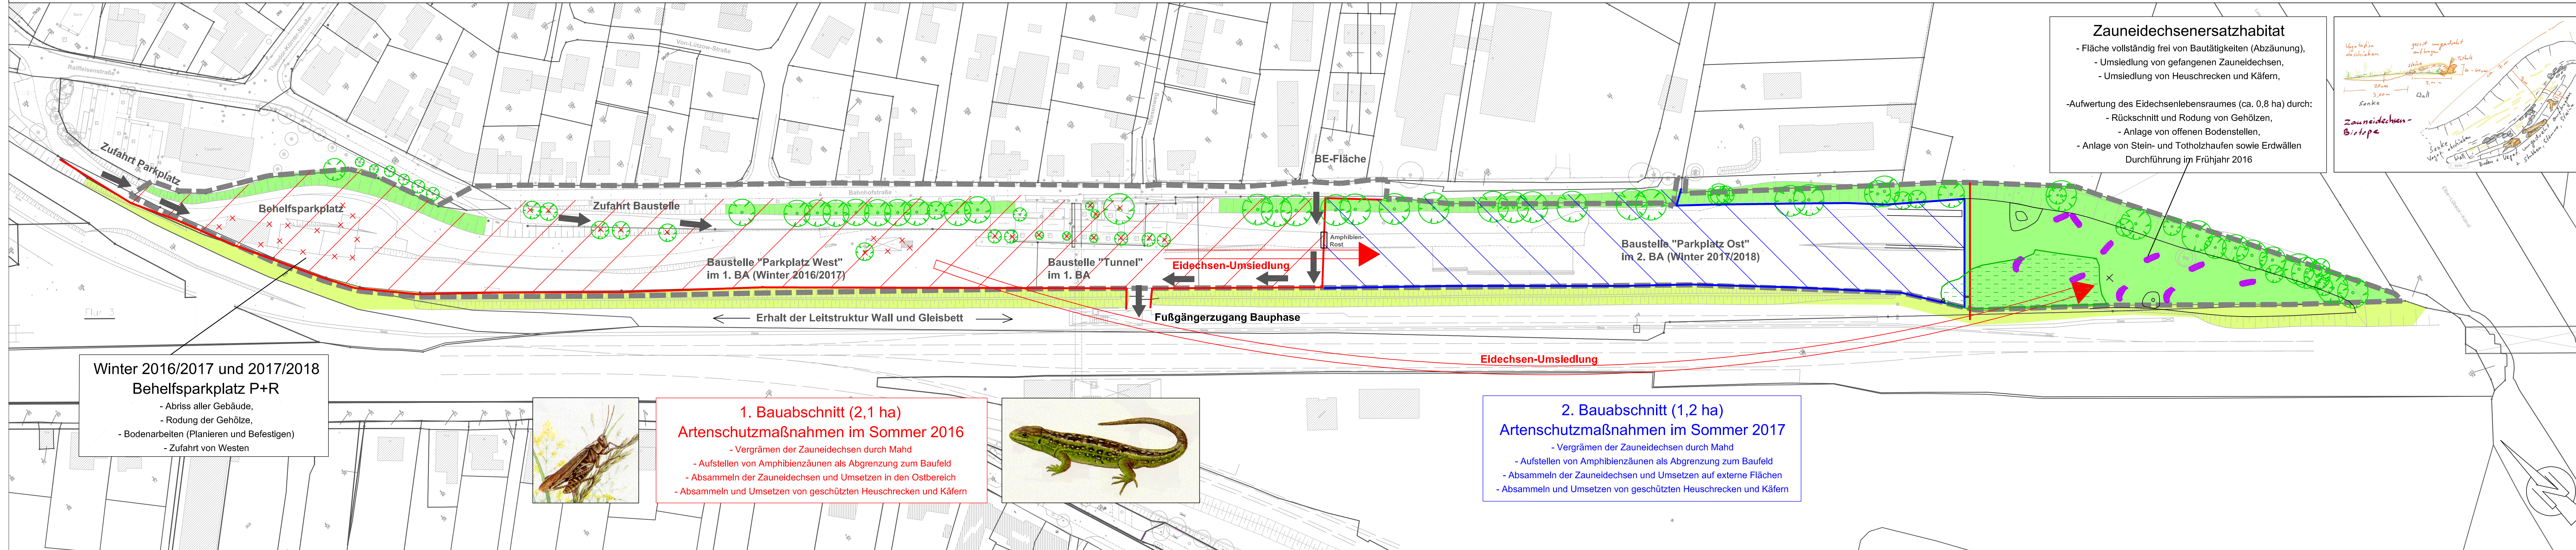


**Zauneidechsenersatzhabitat**

- Fläche vollständig frei von Bautätigkeiten (Abzäunung),
- Umsiedlung von gefangenen Zauneidechsen,
- Umsiedlung von Heuschrecken und Käfern,

-Aufwertung des Eidechsenlebensraumes (ca. 0,8 ha) durch:


- Rückschnitt und Rodung von Gehölzen,
- Anlage von offenen Bodenstellen,
- Anlage von Stein- und Totholzhaufen sowie Erdwällen

Durchführung im Frühjahr 2016

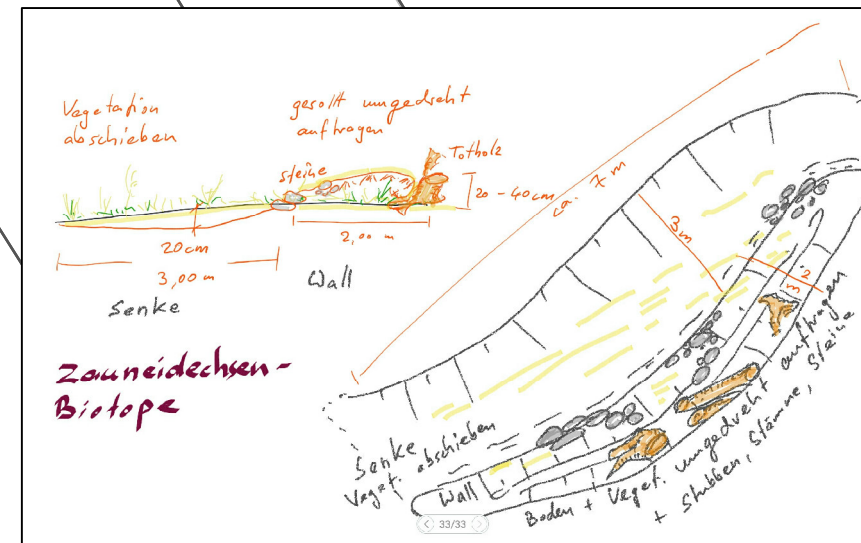


**Winter 2016/2017 und 2017/2018**  
Behelfsparkplatz P+R

- Abriss aller Gebäude,
- Rodung der Gehölze,
- Bodenarbeiten (Planieren und Befestigen)
- Zufahrt von Westen



**1. Bauabschnitt (2,1 ha)**  
**Artenschutzmaßnahmen im Sommer 2016**

- Vergrämen der Zauneidechsen durch Mahd
- Aufstellen von Amphibienzäunen als Abgrenzung zum Baufeld
- Absammeln der Zauneidechsen und Umsetzen in den Ostbereich
- Absammeln und Umsetzen von geschützten Heuschrecken und Käfern



**2. Bauabschnitt (1,2 ha)**  
**Artenschutzmaßnahmen im Sommer 2017**

- Vergrämen der Zauneidechsen durch Mahd
- Aufstellen von Amphibienzäunen als Abgrenzung zum Baufeld
- Absammeln der Zauneidechsen und Umsetzen auf externe Flächen
- Absammeln und Umsetzen von geschützten Heuschrecken und Käfern

## LEGENDE

- ✗ Abriss der Gebäude und Rodung von Bäumen
- 1. BA: Umsiedlung im Sommer 2016, Bau im Winter 2016/2017
- 2. BA: Umsiedlung im Sommer 2017, Bau im Winter 2017/2018
- Herstellung von Eidechsenersatzhabitaten
- Amphibienschutzzaun 2016 bis 2018
- Amphibienschutzzaun 2017 bis 2018
- Erhalt von Grünflächen innerhalb des Geltungsbereiches
- Erhalt von wertvollen Biotopbeständen im Geltungsbereich
- Erhalt von Grünflächen außerhalb des Geltungsbereiches
- Erhalt von Bäumen (SID > 20 cm)

## chronologischer Ablauf Artenschutzkonzept und Baumaßnahmen

	Feb. 16	März 16	April 16	Mai 16	Juni 16	Juli 16	Aug. 16	Sept. 16	Okt. 16	Nov. 16	Dez. 16	Jan. 17	Feb. 17	März 17	April 17	Mai 17	Juni 17	Juli 17	Aug. 17	Sept. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dez. 17	Jan. 18	Feb. 18	März 18	April 18				
<b>Zaun-Eidechsen</b>		Herrichten der Umsiedlungsfläche	Aufstellen Schutzzaun	Absammeln von Tieren im 1. BA: 25 Fangtage mit je 2-3 Personen (auf Umsiedlungsfläche: bis zu 20 Tiere, dann ext. Ausgleichsfläche)										Aufstellen Schutzzaun	Absammeln von Tieren im 2. BA: 25 Fangtage mit je 2-3 Personen (auf ext. Ausgleichsfläche umsetzen)										Rückbau Schutzzaun						
<b>Käfer, Heuschr. Amphibien</b>				Absammeln von Tieren im 1. BA: insgesamt 10 Fangtage mit je 1-2 Personen (Setzen auf Umsiedlungsfläche)															Absammeln von Tieren im 1. BA: insgesamt 10 Fangtage mit je 1-2 Personen (Setzen auf Umsiedlungsfläche)												
<b>Vögel</b>	Rodung der Gehölze und Bäume																			Vergrämnungsmaßnahmen bei Bedarf											
<b>Fledermäuse</b>																															
<b>Baumaßnahme</b>	Artenschutzmaßnahmen: Schutzzaun aufstellen, Habitate bauen										Herrichten des Parkplatzes, Inbetriebnahme				Umsetzung 1. BA (Tunnelrückbau, Eingangsbereich Tunnel, Tiefbauarbeiten Parkplatz West, Herrichtung Parkplatz West)						Umsetzung 2. BA (Tiefbauarbeiten Parkplatz Ost, Herrichtung Parkplatz Ost, Asphaltarbeiten, Begrünungsmaßnahmen)										

## Umweltbericht Zauneidechsenkonzept Anlage 3 Blatt 3

Satzung der  
Gemeinde Büchen über den  
Bebauungsplan Nr. 43  
"Ladestraße/Bahnhofstraße"  
Kreis Herzogtum Lauenburg
